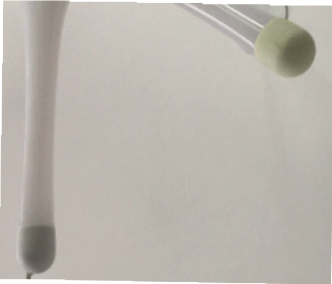


月日		時間	場所	同行者・担当者	研修内容及び記録	所感	
12/14/2016	水	AM	KL Office	Mr.Sathiasseelan, 國納GM, 弘田GM, 村野	SECOM	朝10時から6人体制でセキュリティの設置を行っていた。	
				Mr.Sathiasseelan, 國納GM, 弘田GM, 村野	SystemXの接続部品の確認	弘田GMが持参したSystemXの接続部品の色(白)が始めに送られたもの(クリーム色)と違っていた。後日、色確認後、取り替えるとのこと。	
				Mr.Sathiasseelan, 國納GM, 弘田GM, 村野 SAKURA様	什器納品確認	壊れていたカウンターの引き出しが修理され、ケーブルの穴の蓋がついた。	
				Mr.Sathiasseelan, 國納GM, 弘田GM, 村野 Swerve様	内装工事	・トイレにティッシュホルダーがついた。 ・1階のバックヤードの右のドアの鍵が壊れてたので修正してもらった。 ・1階のバックヤードのケーブルの穴が汚かったのでプラスチックをはめてもらった。 ・1階から3階のトイレのスイッチの場所がばらばらだったのを統一してもらった。	
		PM	Cima Lighting	村野	電球購入	Yamagiwaにてマレーシアの電球をテストするとのこと。サンプルを購入し、後ほどYamagiwaまで送付。	
12/15/2016	木		KL Office	村野, SECOM様		朝10時から6人体制でセキュリティの設置を行っていた。	
				村野, Swerve様		ウォッシュレットは、部品が足りず、現在確認中。	
				村野, SAKURA様		打ち合わせ用のテーブルと椅子は納品されたが、塗装がはがれていたため、テーブルの1つを持ち帰り修正してもらうことになった。再納品は来週火曜。椅子は4脚注文したが、8脚きた。追加料金はないので使ってくださいとのこと。	

12/16/2016	金		KL Office	村野、SECOM様	セキュリティ設置	朝10時から6人体制でセキュリティの設置を行っていたが、ケーブルの設置が終わらず、来週火曜に続きを行うことになった。	
				村野、TELECOM様	インターネット設置	Wi-Fiのパスワードがわからなかったため、TELECOMに再設定してもらった。	
						現在の電球の在庫確認	
